

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดรายจ่ายลงทุน

จำนวน 31 รายการ วงเงิน 314.6427 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. ครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ วงเงิน 39.0474 ล้านบาท

ลงนามสัญญาครบทั้ง 19 รายการ มีผลเบิกจ่ายครบแล้ว จำนวน 18 รายการ คงเหลือ 1 รายการ คือ

1.1 รายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ วงเงิน 12.7360 ล้านบาท เบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2564 7.6300 ล้านบาท

2. สิ่งก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ วงเงิน 275.5953 ล้านบาท

ลงนามสัญญาครบทั้ง 12 รายการ มีผลการเบิกจ่ายครบแล้ว จำนวน 5 รายการ คงเหลือ 7 รายการ คือ

	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่าย ณ 30 กย.64
2.1 ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่	110.8251	8.0475 ลบ.
2.2 ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	20.7500	9.3375 ลบ.
2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	22.1800	12.8644 ลบ.
2.4 ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	12.5000	6.2500 ลบ.
2.5 ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัสและส่วนแสดงจระเข้ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	34.7377	17.3688 ลบ.
2.6 ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	14.6000	10.9500 ลบ.
2.7 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	20.7000	10.3500 ลบ.

สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 2564	คิดเป็นร้อยละ	กันเงินเหลือในปี	คิดเป็นร้อยละ
ครุภัณฑ์	39.0474	33.9414	86.92	5.1060	13.08
สิ่งก่อสร้าง	275.5953	114.4708	41.54	161.1245	58.46
รวมทั้งสิ้น	314.6427	148.4122		166.2305	

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 64

ภาพรวม

งบอุดหนุน


งบลงทุน

รายการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	เบิกเงินเหลือจ่าย	รวมเบิกทั้งสิ้น	คิดเป็น (%)	คงเหลือ
1. งบอุดหนุน	491.6703	491.6703	-	491.6703	100.00	-
2. งบลงทุน	314.6427	116.6840	31.7281	148.4121	47.17	166.2305
* ครุภัณฑ์	39.0474	28.5615	5.3799	33.9414	86.92	5.1060
* สิ่งก่อสร้าง	275.5953	88.1225	26.3482	114.4707	41.54	161.1245
รวมทั้งสิ้น	806.3130	608.3543	31.7281	640.0824	79.38	166.2305

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564


(ไม่รวมเงินเหลือจ่าย)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 64

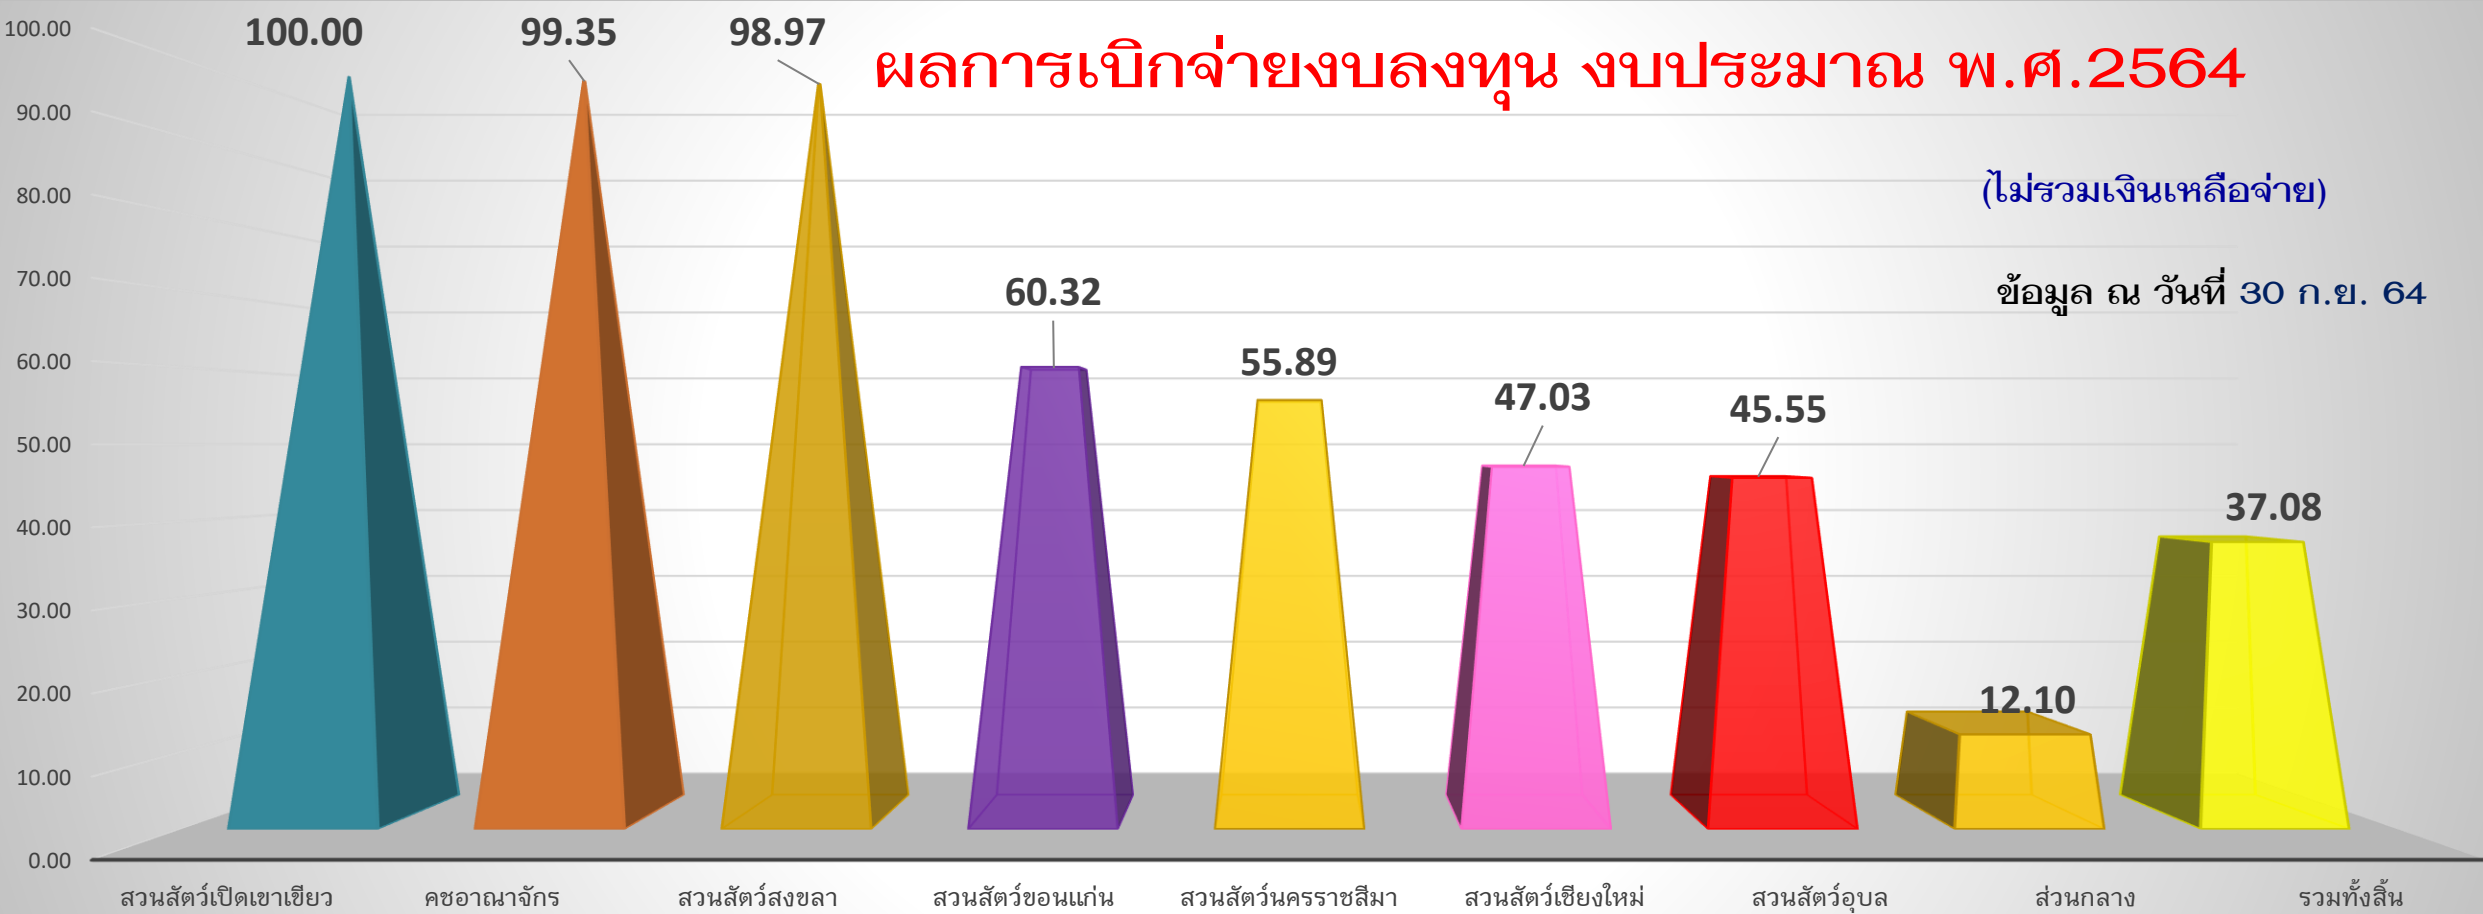

ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	รวมทั้งสิ้น
หน่วยงาน	เขาเขียว	สุรินทร์	สงขลา	ขอนแก่น	นครราชสีมา	เชียงใหม่	อุบล	ส่วนกลาง	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3.0015	6.2493	1.9500	45.2807	43.1100	30.6762	52.0450	132.3300	314.6427
ผลเบิกจ่าย	3.0014	6.2089	1.9300	27.3117	24.0936	14.4255	23.7054	16.0075	116.6840
ร้อยละของการเบิกจ่าย	100.00	99.35	98.97	60.32	55.89	47.03	45.55	12.10	37.08

ผลการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ2564

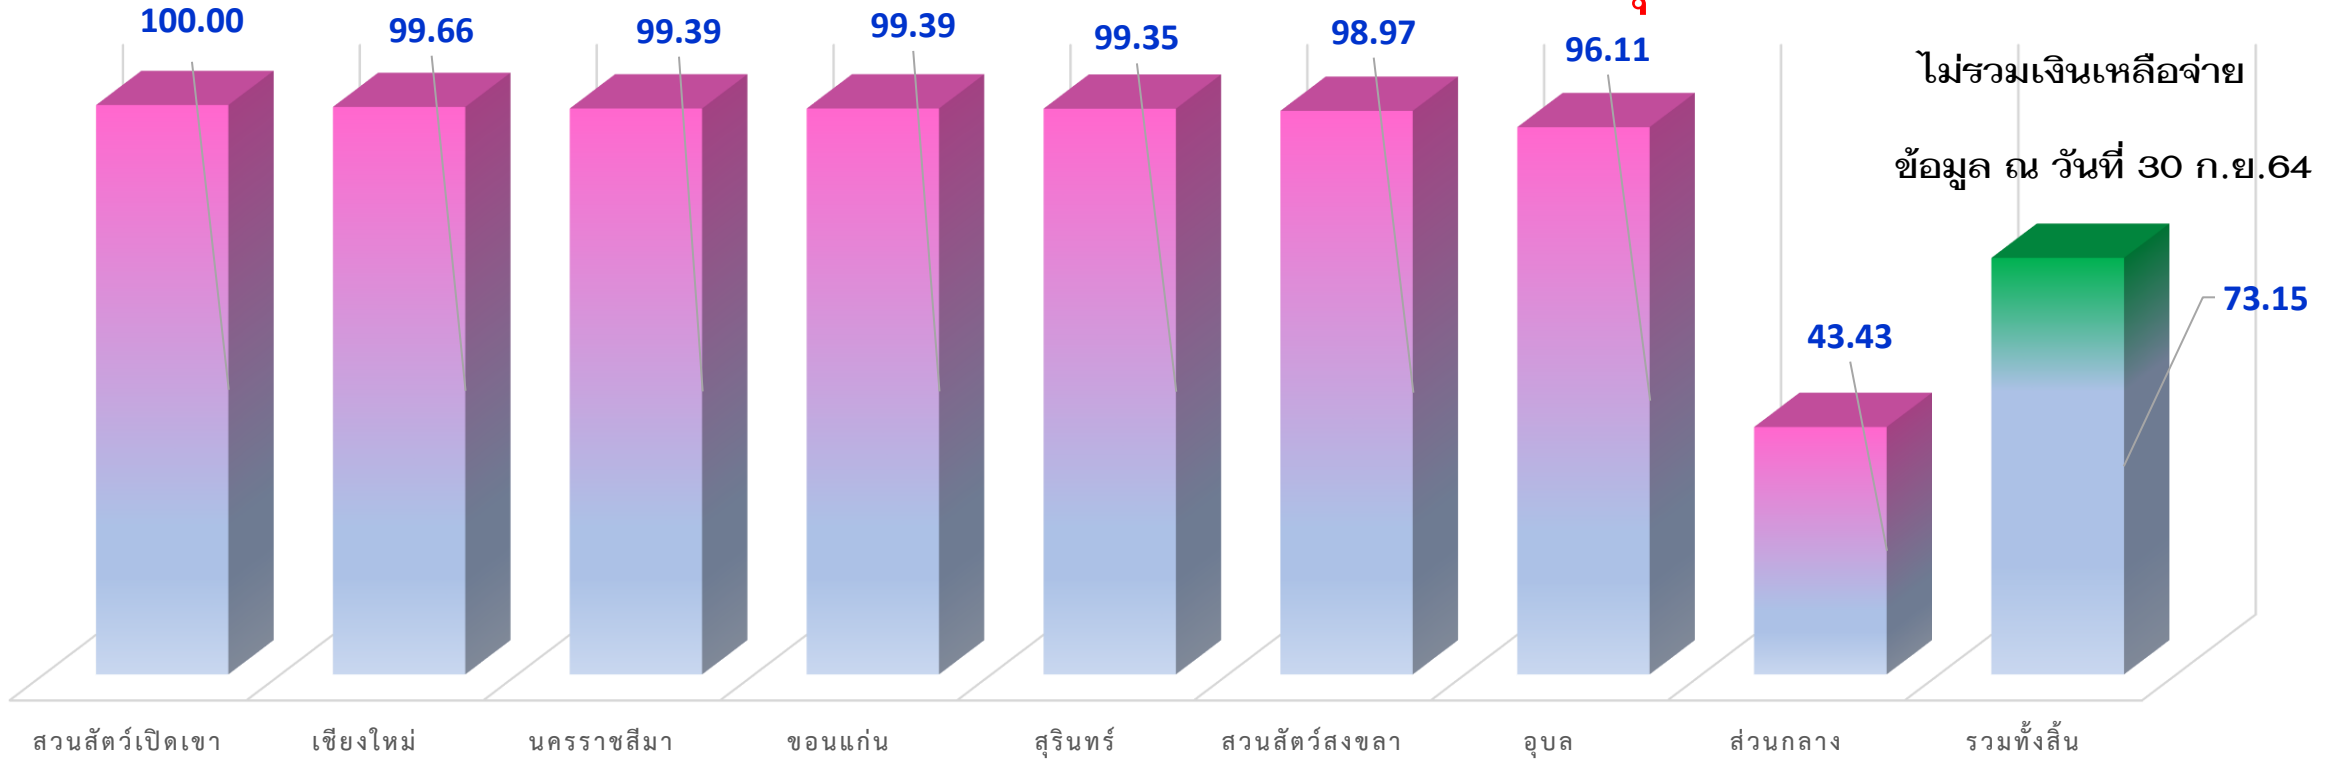


ลำดับที่	1	2	3	4	5	6	7	8	
หน่วยงาน	เขาเขียว	เชียงใหม่	นครราชสีมา	อุบล	สุรินทร์	ขอนแก่น	สงขลา	ส่วนกลาง	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3.0015	2.0299	3.3000	0.0900	6.2493	4.0967	1.9500	18.3300	39.0474
ผลเบิกจ่าย	3.0014	2.0230	3.2800	0.0865	6.2089	4.0717	1.9300	7.9600	28.5615
ร้อยละของการเบิกจ่าย	100.00	99.66	99.39	96.11	99.35	99.39	98.97	43.43	73.15

ผลการเบิกจ่าย สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

ไม่รวมเงินเหลือจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.64

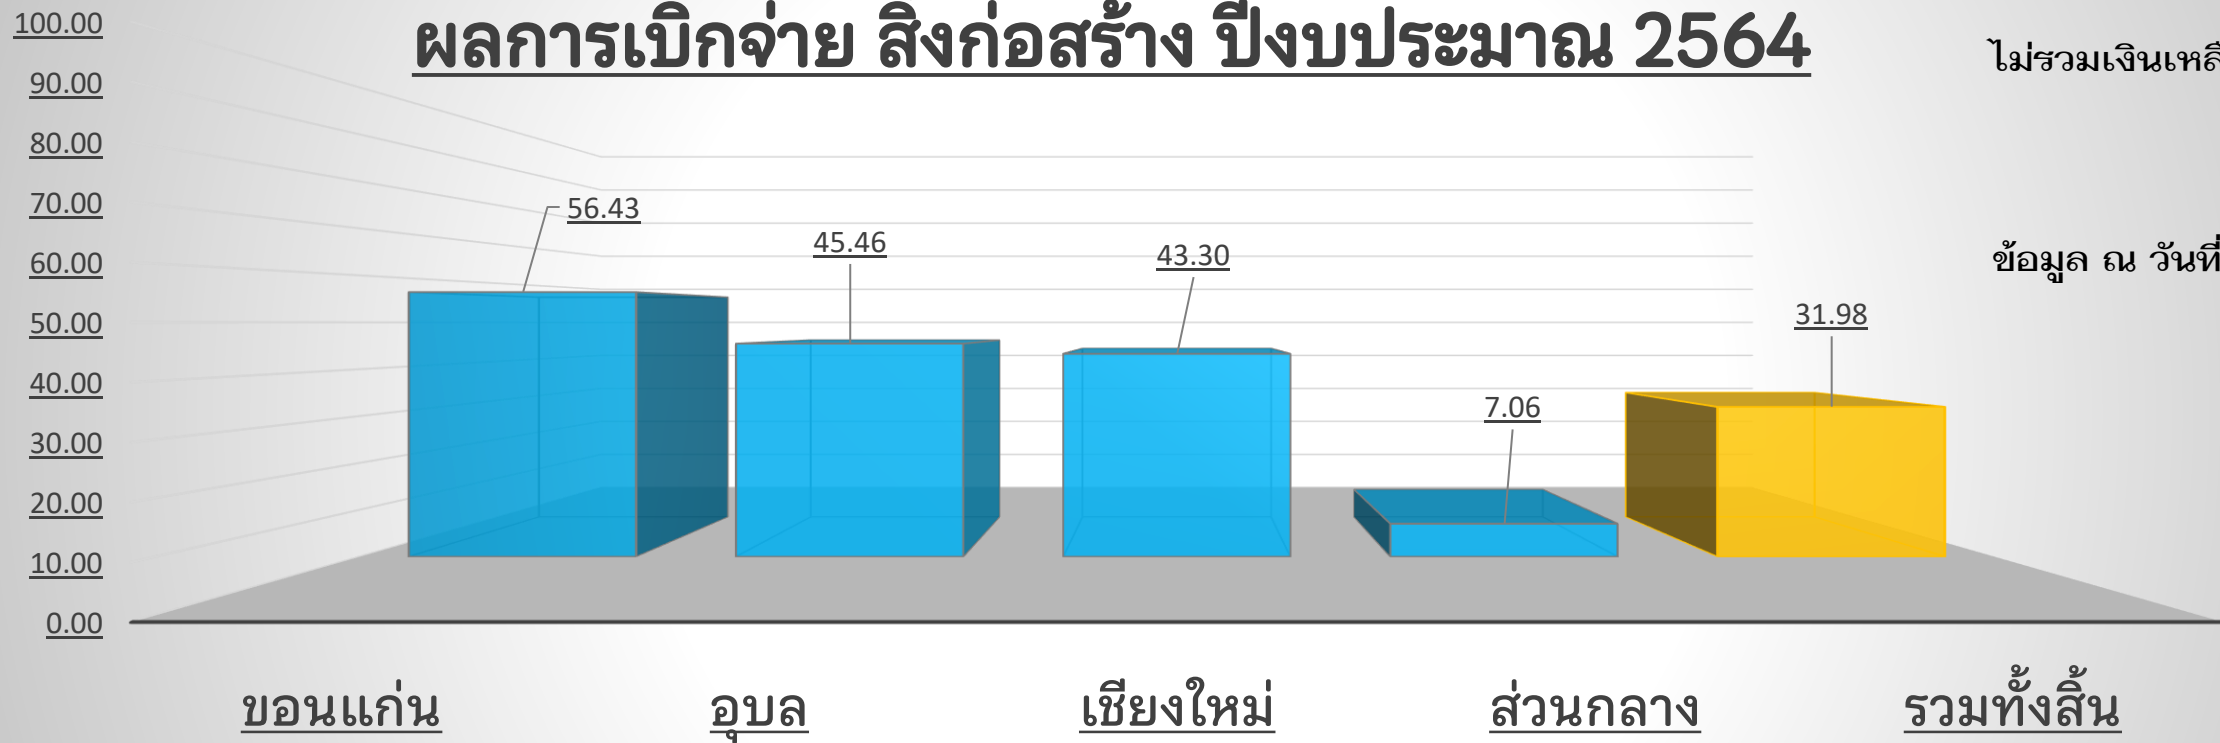

ลำดับที่	1	2	3	4	5	รวมทั้งสิ้น
หน่วยงาน	นครราชสีมา	ขอนแก่น	อุดร	เชียงใหม่	ส่วนกลาง	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	39.8100	41.1840	51.9550	28.6463	114.0000	275.5953
ผลเบิกจ่าย	20.8136	23.2400	23.6189	12.4025	8.0475	88.1225
ร้อยละของการเบิกจ่าย	52.28	56.43	45.46	43.30	7.06	31.98

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินงานงบประมาณปี 2564 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ลงนามสัญญา	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	เงินกันเหลือปี	ปัญหาอุปสรรคที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน	
		วงเงินที่ลงนาม				ปัญหาอุปสรรคที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	แนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน
	ลงทุน	249,028,800	32,700,325	203,828,475	166,230,520		
	ครุภัณฑ์	12,736,000	-	12,736,000	5,106,000		
	สิ่งก่อสร้าง	236,292,800	32,700,325	191,092,475	161,124,520		
	ครุภัณฑ์	12,736,000	-	12,736,000	5,106,000		
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ องค์การสวนสัตว์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	12,736,000	-	12,736,000	5,106,000	ตามสัญญาจะเริ่มดำเนินการส่งสัตว์ให้องค์การ สวนสัตว์ฯ ตามรายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 วันที่ 15 มิ.ย. - 15 กค. 64 ช่วงที่ 2 วันที่ 16 กค. - 15 สค. 64 ช่วงที่ 3 วันที่ 16 สค. - 15 กย. 64 ช่วงที่ 4 วันที่ 16 กย. - 6 ตค. 64 ในช่วงที่ 1 บริษัทฯได้ส่งมอบสัตว์แล้ว 2 รายการ ให้กับสวนสัตว์ขอนแก่น คือ นกฟลามิงโกแคริเบียน 14 ตัว และนกฟลามิงโกใหญ่ 15 ตัว ซึ่งเป็นไปตาม แผนและสวนสัตว์ขอนแก่นอยู่ระหว่างการกักโรค และ รับรองสุขภาพสัตว์ ระยะเวลา 30 วัน ซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐานของสวัสดิภาพสัตว์ ช่วงที่ 2 บริษัทฯ ได้ส่งมอบสัตว์แล้ว 6 รายการให้กับ สวนสัตว์อุบลราชธานี	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	236,292,800	32,700,325	191,092,475	161,124,520		
1	ส่วนกลาง คำออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง ปี 2563 = 36,000,000 บาท ปี 2564 = 110,825,100 บาท วงเงินสัญญา 146,825,100 บาท	110,825,100	-	110,825,100	102,777,570	1. งานงวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อ เม.ย. 2564 โดยใช้จากงบประมาณ ปี 2563 2. งานงวดที่ 2 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก 2.1 มีคณะกรรมการ ที่กำกับดูแลหลายชุด และมี ความเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถรวบรวม และสรุปแนวความคิดได้ ทำให้ต้องมีการตรวจสอบ การดำเนินงานอีกครั้ง 2.2 เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นงบประมาณ ปี 2563 ซึ่งหากการเบิกจ่ายล่าช้า อาจส่งผลให้งบประมาณ รายกาดังกล่าวถูกพับไป	ให้คณะกรรมการทุกชุดเร่งสรุปความคิด เห็นให้ที่ปรึกษา PMC2 ตรวจสอบ เพื่อ สรุปการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
2	สวนสัตว์เชียงใหม่ ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลลู่เทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	20,750,000	3,112,500	17,637,500	11,412,500	1. งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งวดที่ 2 3. ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนื่องจากที่ผ่านมาได้ระดม คนงานเพื่อเร่งงานสัตว์น้ำกล้า (งบปี 63) ก่อน และขณะนี้ ได้เร่งดำเนินงานงวดที่ 2	คณะกรรมการฯ ได้ทำหนังสือเร่งรัด การดำเนินงานไปแล้ว 3 ครั้ง พร้อมทั้ง ติดตามการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. 2564
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณ ส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์ นครราชสีมา ตำบลไข่มวงกลม อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	22,180,000	8,428,400	13,751,600	9,315,600	1. งานงวดที่ 3 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 2. งานงวดที่ 4 ดำเนินการได้ 50% เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน ในการก่อสร้าง	สวนสัตว์นครราชสีมา ได้มีหนังสือ เชิญผู้ประกอบการ มาร่วมประชุมหารือ เพื่อหาแนวทาง ในการเร่งรัดการดำเนิน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. 2564
5	สวนสัตว์อุบลราชธานี ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์ อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่	12,500,000	3,125,000	9,375,000	6,250,000	1. งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. งวดที่ 2 ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่ง เอกสารมาเบิกจ่ายยัง อสส.	สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้เชิญผู้ประกอบ มาร่วมประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางใน การเร่งรัดการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ

ลำดับ	รายการ	ลงนามสัญญา	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	เงินกันเหลือในปี	ปัญหาอุปสรรคที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน	
		วงเงินที่ลงนาม				ปัญหาอุปสรรคที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	แนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน
	อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี					3. อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ต.ค.64	ดำเนินการจัดหาคนงานภายในพื้นที่เข้ามาดำเนินการทดแทนคนงานที่ขาดไป
						4. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ผู้ประกอบการดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้รับประกอบการไม่สามารถเข้ามาดำเนินการได้	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. 2564
6	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัสและส่วนแสดงจระเข้ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	34,737,700	8,684,425	26,053,275	17,368,850	1. เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามแผน 2. อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2	เนื่องจากรายการดังกล่าว ลงนามสัญญาล่าช้า จึงได้มีการประชุมติดตามและเร่งรัดระหว่างคณะกรรมการกับผู้ประกอบการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มค 2565
7	สวนสัตว์ขอนแก่น ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	14,600,000	7,300,000	7,300,000	3,650,000	1. เบิกจ่ายงวดที่ 1 - 2 เรียบร้อยแล้ว 2. งวดที่ 3 อยู่ระหว่างขอขยายเวลาเพิ่ม 15 วัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ	1. คณะกรรมการได้ดำเนินการ ส่งหนังสือเร่งรัดการดำเนินงาน งวดที่ 3-4 เพื่อให้ทันและเป็นไปตามกำหนดในสัญญา 2. ให้ผู้ประกอบการส่งแผนการดำเนินงานและจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อรายการความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค เป็นประจำ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 2564
8	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,700,000	5,175,000	15,525,000	10,350,000	1. งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. งวดที่ 2 คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่าย 3. เนื่องจากสวนสัตว์ขอนแก่น ไม่ได้ขออนุญาตการใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ก่อนการเสนอของประมาณ จึงทำให้การส่งมอบพื้นที่ในการก่อสร้างล่าช้า ส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าไปด้วย	1. เนื่องจากการส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้ประกอบการ การล่าช้า สวนสัตว์ขอนแก่นจึงขออนุมัติให้มีการขยายเวลา โดยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ อนุมัติให้ขยายเวลาเพิ่มอีก 97 วัน 2. คณะกรรมการ ทำหนังสือเร่งรัดการส่งมอบงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดในสัญญา 3. ให้ผู้ประกอบการส่งแผนการดำเนินงานและจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อรายการความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค เป็นประจำ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มค 2565

องค์การสวนสัตว์
รายงานงบประมาณปี 2564 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	สัญญาเลขที่/บริษัท	ลงนามสัญญา			รวมเบิกจ่าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	เงินกันเหลือปี	แผน/ผล	จำนวนงวดงาน												ปัญหาอุปสรรคที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนและแนวทางการแก้ไขในการดำเนินงาน						
				เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินที่ลงนาม					รวมงวดงาน	มค 64	กพ 64	มีค 64	เมย 64	พค 64	มิย 64	กค 64	สค 64	กย 64	ตค 64	พย 64	ธค 64	ปัญหาอุปสรรคที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	แนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน				
																										งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4
	ลงทุน	277,789,000	-	-	-	249,028,800	32,700,325	203,828,475	166,230,520																				
	ครุภัณฑ์	18,000,000	-	-	-	12,736,000	-	12,736,000	5,106,000																				
	สิ่งก่อสร้าง	259,789,000	-	-	-	236,292,800	32,700,325	191,092,475	161,124,520																				
	ครุภัณฑ์	18,000,000	-	-	-	12,736,000	-	12,736,000	5,106,000																				
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ องค์การสวนสัตว์ แขวงบางซื่อ เขตบาง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	18,000,000	บริษัท เสี่ย-เห็ด บิสซิเนส จำกัด	8 มิย.64		12,736,000	-	12,736,000	5,106,000	แผนส่งงาน ส่งงาน/ตรวจรับ เบิกจ่าย							งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4								ตามสัญญาจะเริ่มดำเนินการส่งสัตว์ให้องค์การ สวนสัตว์ฯ ตามรายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 วันที่ 15 มิย. - 15 กค. 64 ช่วงที่ 2 วันที่ 16 กค. - 15 สค. 64 ช่วงที่ 3 วันที่ 16 สค. - 15 กย. 64 ช่วงที่ 4 วันที่ 16 กย. - 6 ตค. 64 ในช่วงที่ 1 บริษัทฯได้ส่งมอบสัตว์แล้ว 2 รายการ ให้กับสวนสัตว์ขอนแก่น คือ นากพลามิงโกแคเรียเบียน 14 ตัว และนากพลามิงโกใหญ่ 15 ตัว ซึ่งเป็นไปตาม แผนและสวนสัตว์ขอนแก่นอยู่ระหว่างการกักโรค และ คุ้มครองสุขภาพสัตว์ ระยะเวลา 30 วัน ซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐานของสวัสดิภาพสัตว์ ช่วงที่ 2 บริษัทฯ ได้ส่งมอบสัตว์แล้ว 6 รายการให้กับ สวนสัตว์อุบลราชธานี	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	259,789,000				236,292,800	32,700,325	191,092,475	161,124,520																				
1	ส่วนกลาง ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัด 1 แห่ง ปี 2563 = 36,000,000 บาท ปี 2564 = 110,825,100 บาท วงเงินสัญญา 146,825,100 บาท	114,000,000	ส.11/2564 บริษัท ดีไซน์ + ดีเวลลอป จำกัด	1 ธค.63	24 พค.65	110,825,100	-	110,825,100	102,777,570	แผนส่งงาน ส่งงาน/ตรวจรับ เบิกจ่าย	6		งวดที่ 1		งวดที่ 2	งวดที่ 1	7,341,255	งวดที่ 3		งวดที่ 4								1. งานงวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อ เมย. 2563 โดยใช้งบประมาณ ปี 2563 เห็นให้ที่ปรึกษา PMC2 ตรวจสอบ เพื่อ 2. งานงวดที่ 2 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก 2.1 มีคณะกรรมการ ที่กำกับดูแลหลายชุด และมี ที่เกี่ยวข้องต่อไป ความเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถรวบรวม และสรุปแนวความคิดได้ ทำให้ต้องมีการตรวจสอบ การดำเนินงานอีกครั้ง 2.2 เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นงบประมาณ ปี 2563 ซึ่งหากการเบิกจ่ายล่าช้า อาจส่งผลให้งบประมาณ รายการดังกล่าวถูกพับไป	

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	สัญญาเลขที่/บริษัท	ลงนามสัญญา			รวมเบิกจ่าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	เงินกันเหลือปี	แผน/ผล	จำนวนงวดงาน												ปัญหาอุปสรรคที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน						
				เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินที่ลงนาม					รวมงวดงาน	มค 64	กพ 64	มีค 64	เมย 64	พค 64	มิย 64	กค 64	สค 64	กย 64	ตค 64	พย 64	ธค 64	ปัญหาอุปสรรคที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	แนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน				
2	ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	25,000,000	ส.10/2564	24 กพ.64	20 พย.64	20,750,000	3,112,500	17,637,500	11,412,500	แผนส่งงาน ส่งงาน/ตรวจรับ เบิกจ่าย	6				งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3		งวดที่ 4	งวดที่ 5	งวดที่ 6							1. งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งวดที่ 2 3. ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนื่องจากที่ผ่านมาได้ระดมคนงานเพื่อเร่งงานสัตว์น้ำ (งบปี 63) ก่อน และขณะนี้เร่งดำเนินการงวดที่ 2	คณะกรรมการฯ ได้ทำหนังสือแจ้งรัดการดำเนินงานไปแล้ว 3 ครั้ง พร้อมติดตามการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน พย. 2564
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดกิจกรรมบริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ภายในสวนนรกราชสีมา ตำบลขี้เม็งจล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	29,650,000	ส.20/2564 บริษัท	31 ธค.63	27 สค.64	22,180,000	8,428,400	13,751,600	9,315,600	แผนส่งงาน ส่งงาน/ตรวจรับ เบิกจ่าย	5		งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	งวดที่ 5	งวดที่ 3										1. งานงวดที่ 3 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 2. งานงวดที่ 4 ดำเนินการได้ 50% เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน 3. คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน	สวนสัตว์นครราชสีมา ได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการ มาร่วมประชุมหารือ เพื่อหาแนวทาง ในการเร่งรัดการดำเนินงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน พย. 2564
5	ปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000	ส.12/2564 บริษัท ไรท์แมน	19 เมย.64	25 กย.64	12,500,000	3,125,000	9,375,000	6,250,000	แผนส่งงาน ส่งงาน/ตรวจรับ เบิกจ่าย	5	งวดที่ 1			งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	งวดที่ 5	งวดที่ 1	งวดที่ 2								1. งวดที่ 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. งวดที่ 2 ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่งเอกสารเบิกจ่ายยัง อสส. 3. อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 3 คาดว่าจะแล้วภายใน คค.64 4. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ผู้ประกอบการดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้รับประกอบการไม่สามารถเข้ามาดำเนินการได้	สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้เชิญผู้ประกอบการ มาร่วมประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางในการเร่งรัดการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ดำเนินการจัดหาคนงานภายในพื้นที่ เข้ามาดำเนินการทดแทนคนงานที่ขาดไป คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน พย. 2564
6	ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัสและส่วนแสดงจระเข้ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	36,955,000	ส.16/2564	4 มิย.64	23 ธค.64	34,737,700	8,684,425	26,053,275	17,368,850	แผนส่งงาน ส่งงาน/ตรวจรับ เบิกจ่าย	5					งวดที่ 1		งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	งวดที่ 5							1. เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตาม 2. อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2	เนื่องจากรายการดังกล่าว ลงนามสัญญาล่าช้า จึงได้มีการประชุมติดตามและเร่งรัดระหว่างคณะกรรมการกับผู้ประกอบการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มค 2565

